



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	141/2023
Názov materiálu:	Informatívna správa o stave projektov financovaných z externých zdrojov
Spracovateľ:	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Napísal:	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia Andrea Oravcová – referentka – projektová manažérka
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	27.04.2023
Dátum vyhotovenia:	26.04.2023

Návrh na uznesenie:	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Informatívnu správu o stave projektov financovaných z externých zdrojov b e r i e n a v e d o m i e Informatívnu správu o stave projektov financovaných z externých zdrojov
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Dôvodová správa

Odbor projektového a strategického riadenia predkladá informácie o stave projektov financovaných z externých zdrojov, primárne zo zdrojov EŠIF. Informácie sú aktualizované k dátumu 25.4.2023. Do zoznamu projektov sú zahrnuté projekty, ktoré sú v realizácii alebo prebieha verejné obstarávanie. Na všetky projekty v prílohe sú uzatvorené zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku alebo iného príspevku, a teda sú rozpočtovo kryté z externých zdrojov. Zoznam projektov neobsahuje projekty, ktoré sú v schvaľovacom procese.

V rámci dokumentu sú uvedené informácie ohľadom neoprávnených výdavkov, t.j. výdavky definované riadiacim orgánom ako neoprávnené alebo práce navyšiac pri niektorých projektoch. Pri projektoch v procese verejného obstarávania je rozdiel medzi podanou výškou NFP a aktualizáciou rozpočtu pri vyhlásení VO. V niektorých prípadoch sú uvedené odhadované sumy na neoprávnené výdavky/práce navyšiac, nakoľko nedisponujeme presnými výkazmi daných prác.



Dokument obsahuje údaje o žiadostiach o platbu, kde je definované financovanie k dátumu 25.4.2023. Financovanie projektov sú naviazané na termíny fakturácie v zmysle uzatvorených zmlúv. V niektorých prípadoch nie je čerpanie zdrojov, nakoľko fakturácia diela je naviazaná na ukončenie celého diela.

Projekty v rámci programového obdobia 2014-2020 je možné v zmysle riadiacej dokumentácie dokončiť do 31.12.2023 (posledný deň fakturácie) a sfunkčnúť do 31.7.2024. Realizácia projektu po tomto termíne je povolená, ale na náklady mesta. Nedodržanie termínu po 31.12.2023 nebude mať za následok vrátenie celého príspevku, avšak termín sfunkčnenia projektu musí byť dodržaný. Nedodržanie sfunkčnenia projektu do definovaného termínu bude mať za dôsledok vrátenie celého príspevku. Všetky projekty majú harmonogram prác naplánovaný tak, aby bol termín 31.12.2023 dodržaný a projekty zrealizované.


Stav projektov

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina NFP302010L755		
Podanie žiadosti o NFP	14.03.2018	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	9/2018 - číslo zmluvy 2024/2018	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	1 188 388, 10 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	1 250 934, 84 €	
Celkový výška neoprávnených výdavkov	17 451,92 € rozdiel medzi zmluvu s dodávateľom a NFP	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	62 546, 74 €	
Predpokladané práce navyš	350 000 € (spevnenie prechodov, vodovodných potrubí, železničné priecestie) - odhad	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
1 063294, 61 €	125 093, 49 €	62 546, 74 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	100 mesiacov (vrátene podporných aktivít, doba realizácie je 10 mesiacov v rámci zmluvy o NFP)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	9/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	7/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Žiadosť na ex post bola odoslaná 19.09.2022, po kladnom rozhodnutí (4.11.) sme začali realizovať	
Ukončenie procesu VO	9/2022	
.Podpis zmluvy o dielo.	16.09.2022 - číslo zmluvy 1844/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Baumann Nitra s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	1 268 386, 76 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	28. 11. 2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 28.11.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 28.11.2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	9/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	21.3.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	175 224,08 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	27.3.2023	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	

Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-
Dátum predloženia tretej ŽoP	-
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-

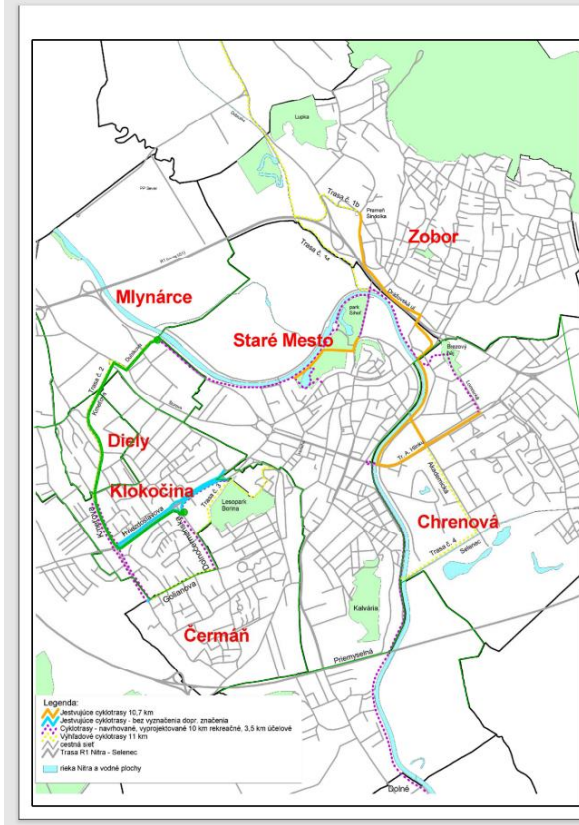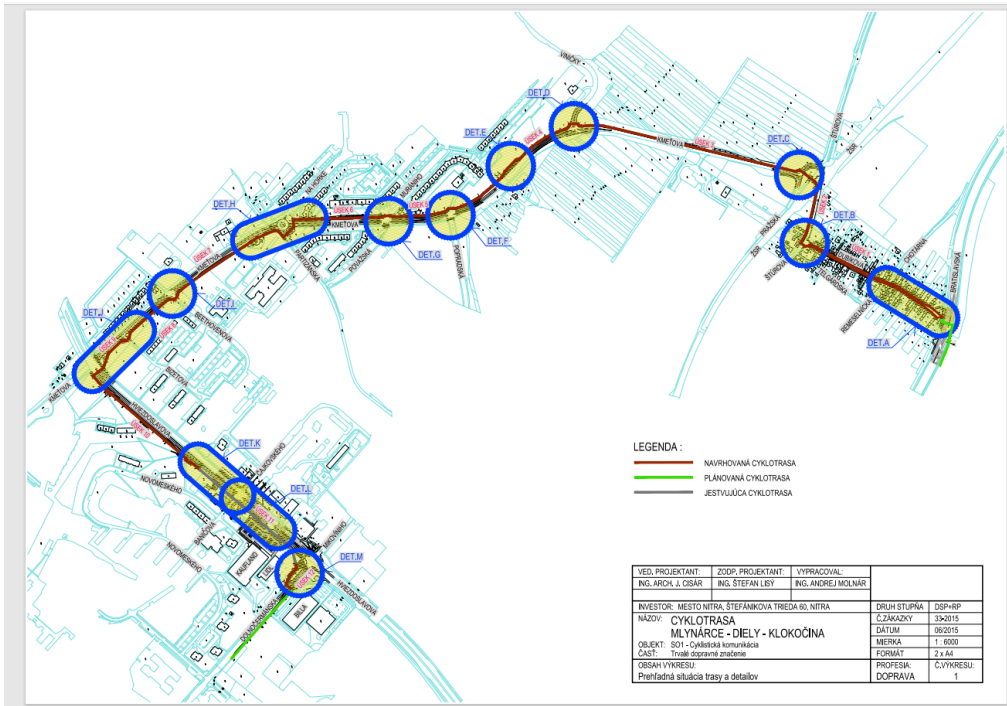

PROJEKTOVANÁ CYKLOTRASA DĹŽKY 3,2km

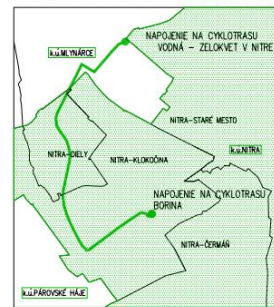


AUTOR : ING. ARCH. OŠKAR JIRAJ
ARCHITEKTÓNICKY A TELEK. ORNÁM. NITRA

PROJEKTANT: ING. SŤANÓVA KATARÍNA

INVESTOR: MESTO NITRA
ŠTEFANKOVA TRIEA 60, NITRA

DOPRAVNÉ REŠENIE: ING. ŠTEFAN LIŠY



**CYKLOTRASA
MLYNÁRCE - DIELY - KLOKOČINA**

NÁZOV: SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV


DÁTUM: 06/2015
STUPEŇ: PROJEKT

FORMÁT: 2A4
MERKA: 1:250 000
ČÍSLO VYVREŠU: B-1

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre NFP302040K275		
Podanie žiadosti o NFP	13.03.2019	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	6/2019 - číslo zmluvy 1379/2019, 1754/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	143 006, 75 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	150 533, 42 €	
Celkový výška neoprávnených výdavkov	1 099,03 € - rozdiel medzi zmluvu s dodávateľom a NFP	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	7 526,67 €	
Predpokladané práce navyše	660 € Svietidla – na základe zmenového konania	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85 %	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
127 953, 41 €	15 053, 34 €	7 526,67 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	24 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	9/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Žiadosť na ex post kontrolu bola odoslaná 20.10.2021, kladné rozhodnutie prišlo 31.03.2022, účinnosť naviazaná na CRZ	
Ukončenie procesu VO	10/2021	
Podpis zmluvy o dielo	1.10.2021 - číslo zmluvy 1859/2021	
Dodávateľ stavebných prác	DRYADA garden, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	151 632, 45 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	10/2021	
Dátum skutočného začatia prác	10/2021	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	7.10.2021 nadväznosti na zverejnenie v CRZ	
Predpokladaný termín ukončenia prác	9/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO LESA - BORNA V NITRE

ŠIRŠIE VZŤAHY ÚZEMIA M : 1 : 5000, 10000

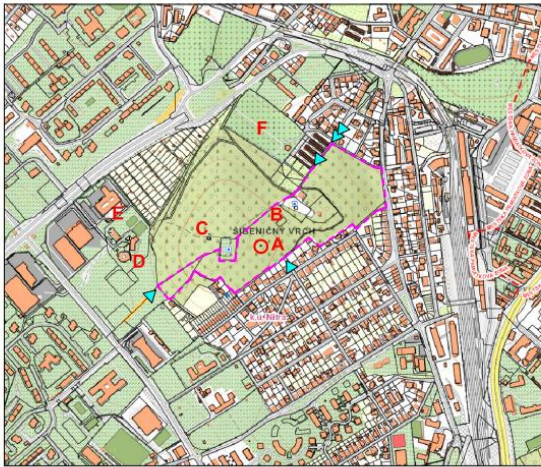

TURISTICKÁ MAPA ČASTI MESTA NITRA M : 1 : 10000




ORTOFOTOMAPA RIEŠENÉHO ÚZEMIA M : 1 : 5000

LEGENDA :

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- A OBJEKT TURECKEJ VARTY
- B ASFALTOVÁ PLOCHA
- C VYSIELAČ
- D KOSTOL SV. GORAZDA
- E POLIKLINIKA KLOKOČINA
- F PÁROVSKÝ CINTORIN
- SÚKROMNÁ PLOCHA ZELENE
- VODÁRENSKÝ AREÁL
- PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA
- ▲ PEŠÍ VSTUP DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- ▲ VSTUP PRE ÚDRŽBU A OBSLUHU

HLAVNÝ PROJEKTANT : ING. ZOLTÁN BALKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA	VYPRACOVAL : ING. ZOLTÁN BALKO	 <p>ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zobalko@astronet.sk</p>
INVESTOR : MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEĎA 60, 950 06 NITRA			
STAVBA : REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO LESA - BORNA V NITRE			ZÁKAZKA ČÍSLO :
PROFESIA : KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	LOKALITA : k. ú. Nitra	DÁTUM : 04 / 2017	VÝKRES Č. :
STAVEBNÝ OBJEKT : SO 01 - SO 04		STUPEŇ : RP	1
OBSAH VÝKRESU : ŠIRŠIE VZŤAHY ÚZEMIA		FORMÁT : 2A 4	

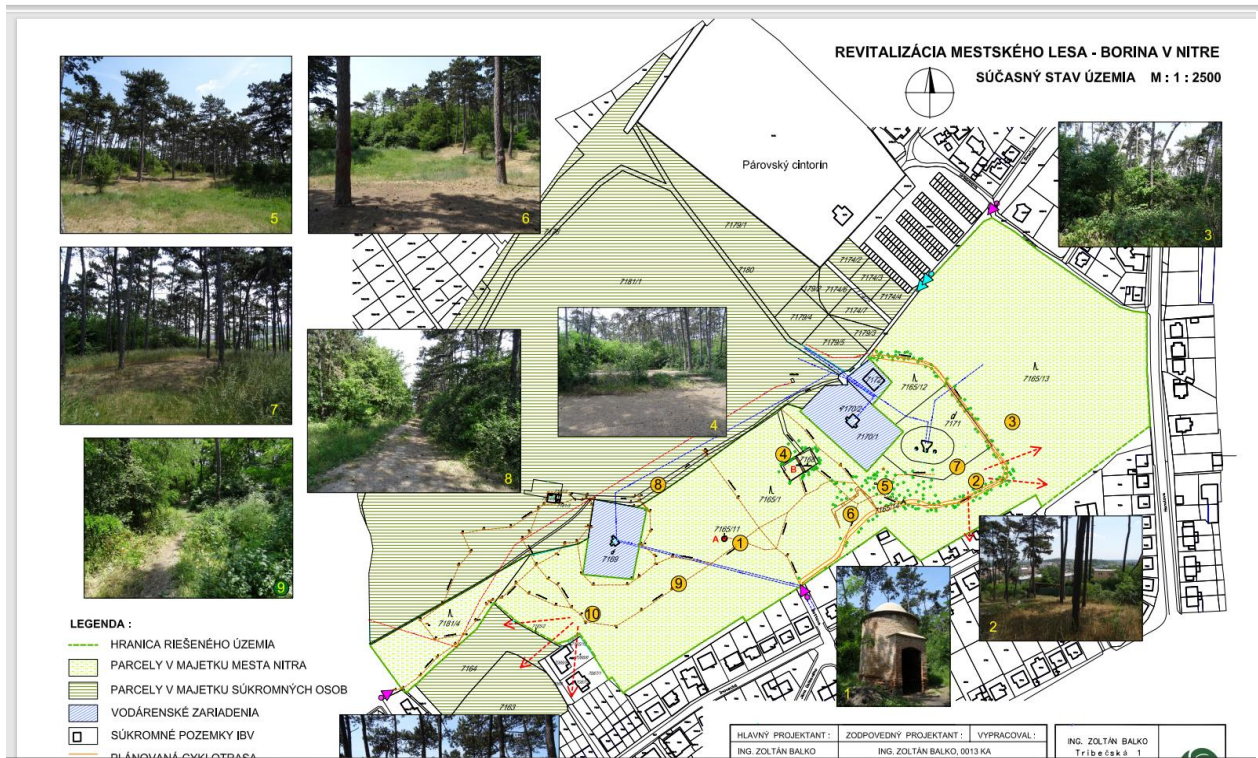

LEGENDA :

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- PARCELY V MAJETKU MESTA NITRA
- PARCELY V MAJETKU SÚKROMNÝCH OSOB
- VODÁRENSKÉ ZARIADENIA
- SÚKROMNÉ POZEMKY IBV
- PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA

HLAVNÝ PROJEKTANT : ING. ZOLTÁN BALKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA	VYPRACOVAL : ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1
--	---	-----------------------------------	----------------------------------

Cyklotrasa Vodná Zelokvet	
Podanie žiadosti o príspevok	15.07.2022
Účinnosť zmluvy o poskytnutí príspevku	POO 100%
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci príspevku	612 935, 12 €
Celková výška oprávnených výdavkov	612 935, 12 €
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €
Spolufinancovanie	0 €
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	
Podiel financovania	
EÚ / POO 100 % 612 935, 12 €	Prijímateľ 0 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	3/23 – 11/23 (posun harmonogramu, možnosť do 2025)
Dĺžka podporných aktivít projektu	
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	11/23
Vyhlásenie VO (výzva)	12/2022
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Plán obnovy a odolnosti nevyžaduje predloženie podkladov na kontrolu VO
Ukončenie procesu VO	3/2023
Podpis zmluvy o dielo	02.03.2023, číslo zmluvy - 534/2023
Dodávateľ stavebných prác	Baumann Nitra s. r. o.
Stavebný dozor	interný
Cena diela v zmysle ZoD	522 297,46 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	odkladacia povinnosť v nadväznosti na schválenie príspevku z POO
Dátum skutočného začatia prác	-
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-
Predpokladaný termín ukončenia prác	11/2023
Dátum predloženia prvej ŽoP	-
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-
Dátum predloženia druhej ŽoP	-
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--
Dátum predloženia tretej ŽoP	-
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-




— Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre

SO 01

AUTOR ARCH. NÁVRHU : OBJEDNÁVATEL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján VÝBOCH	VYKONÁVAČ: Ing. Ján VÝBOCH		
Stavba : Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre		Stupeň : DSP, DRS Dátum : 01/2021 Číslo zák. : 202101 Formát : 1 A4 Mierka : 1 : 10 000		
Objekt : SO 01 – Cyklotrasa Vodná – Zelokvet		č. prílohy 1		
Výkres : PREHEADNÁ SITUÁCIA		č. súpravy		

Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra NFP302070BZG3		
Podanie žiadosti o NFP	06.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	1/2023, číslo zmluvy - 2899/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	89 968,76 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	94 703,96 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	33 893,86 € (aktualizácia rozpočtu pred VO)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	4 735,20 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
80 498,37 €	9 470,40 €	4 735,20 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2023	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác		
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD		
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

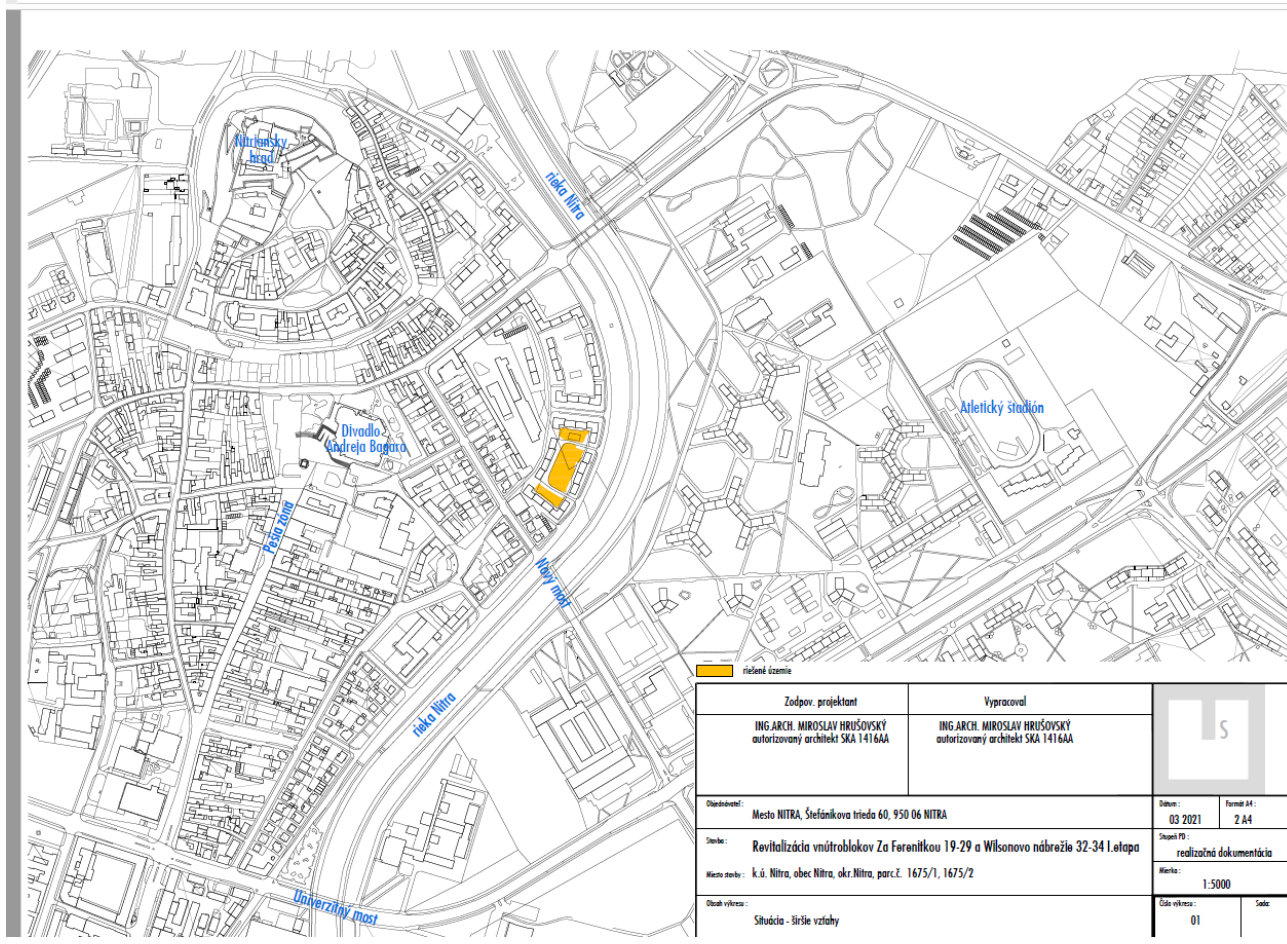

Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre NFP302070BYW5		
Podanie žiadosti o NFP	25.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	1/2023, číslo zmluvy - 2898/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	90 545,34 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	95 310,88 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	3 970,12 € (aktualizácia rozpočtu pred VO)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	4 764, 54 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
81 014, 25 €	9 531, 09 €	4 764, 54 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2023	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác		
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD		
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	



ortofoto M : 1 : 2000



REVITALIZÁCIA LOKÁLNEHO PARKU NA VAŠINOVEJ ULICI V NITRE

ŠIRŠIE VZŤAHY ÚZEMIA M : 1 : 2000, 5000



M : 1 : 5000

LEGENDA:

- - - hranica riešeného územia
- katastrálne hranice parciel
- ▶ vstupy do riešeného územia
- ① Chrenovský cintorín
- ② kostol sv. Martina
- ③ Nitrasko
- ④ obchodné centrum OBI
- ⑤ obchodné centrum NAY
- ⑥ športová hala Olympia

HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. ZOLTÁN BALKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ZOLTÁN BALKO	VYPRACOVÁV. ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO Tribecská 1 849 01 Nitra tel.: 0905 521 950 balko.zoltan@gmail.com	
INVESTOR: MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 60, 950 06 NITRA			ZÁKAZKA ČÍSLO:	
STAVBA: REVITALIZÁCIA LOKÁLNEHO PARKU NA VAŠINOVEJ ULICI V NITRE			DÁTUM: 10 / 2021	VÝKRES Č.:
OBJEKT: LOKALITA: k. ú. CHRENOVÁ			STUPEŇ: R.P.	1
OBSAH VÝKRESU: ŠIRŠIE VZŤAHY ÚZEMIA			FORMÁT: 2 A4	
			MÉRKA: 1 : 2000, 5000	

LEGENDA :

- - - hranica riešeného územia
- A** trávnaté ihrisko
- B** ihrisko pre petanque
- C** telocvičňa v prírode
- D** lanová dráha na preliezanie
- E** stolný tenis
- F** pieskovisko
- G** vertikálna preliezka
- H** horizontálny rotačný valec
- I** šachový a kartársky stôl
- ▬ nádoba na psie exkrementy 1 ks
- ▬ nádoba na odpad 3 ks
- ▬ lavička 7 ks
- ▬ piknikové sedenie 2 ks
- ▬ informačná tabuľa 3 ks
- ▬ stojan na bicykle 2 ks
- ⊙ navrhnutý strom 14 ks
- ▬ parkový trávnik
- ▬ trávnik znášajúci záťaž
- ▬ tieňomilný bylinný porast
- ▬ tvarovaný živý plot
- ▬ štrková plocha
- ▬ dlažba
- ▬ spevnená plocha
- ▬ oplotenie ihriska
- ▬ oplotenie areálu

REVITALIZÁCIA LOKÁLNEHO PARKU NA VAŠINOVEJ ULICI V NITRE


NÁVRH CELKOVÉHO RIEŠENIA M : 1 : 350



- ⊙ jestvujúci strom
- ⊙ jestvujúci strom výrub
- ⊙ jestvujúci strom výrub do 5 rokov
- ⊙ jestvujúci strom presadba
- ⊙ jestvujúci krik
- ⊙ jestvujúci krik výrub
- ▬ jestvujúce herné prvky a bránky
- ▶ vstup do areálu

HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. ZOLTÁN BALKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ZOLTÁN BALKO	VYPRACOVÁV. ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO Tribecská 1 849 01 Nitra tel.: 0905 521 950 balko.zoltan@gmail.com	
INVESTOR: MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 60, 950 06 NITRA			ZÁKAZKA ČÍSLO:	
STAVBA: REVITALIZÁCIA LOKÁLNEHO PARKU NA VAŠINOVEJ ULICI V NITRE			DÁTUM: 10 / 2021	VÝKRES Č.:
OBJEKT: SO 01 - SO 06 LOKALITA: k. ú. CHRENOVÁ			STUPEŇ: R.P.	3
OBSAH VÝKRESU: NÁVRH CELKOVÉHO RIEŠENIA			FORMÁT: 2 A4	
			MÉRKA: 1 : 350	

Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra NFP3020170BTB7		
Podanie žiadosti o NFP	06.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	10/2022, číslo zmluvy - 2079/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	173 009,89 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	182 115,67 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	32 258,71 € (aktualizácia rozpočtu pred VO)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	9 105,78 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
154 798, 32 €	18 211, 57 €	9 105,78 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác		
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD		
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

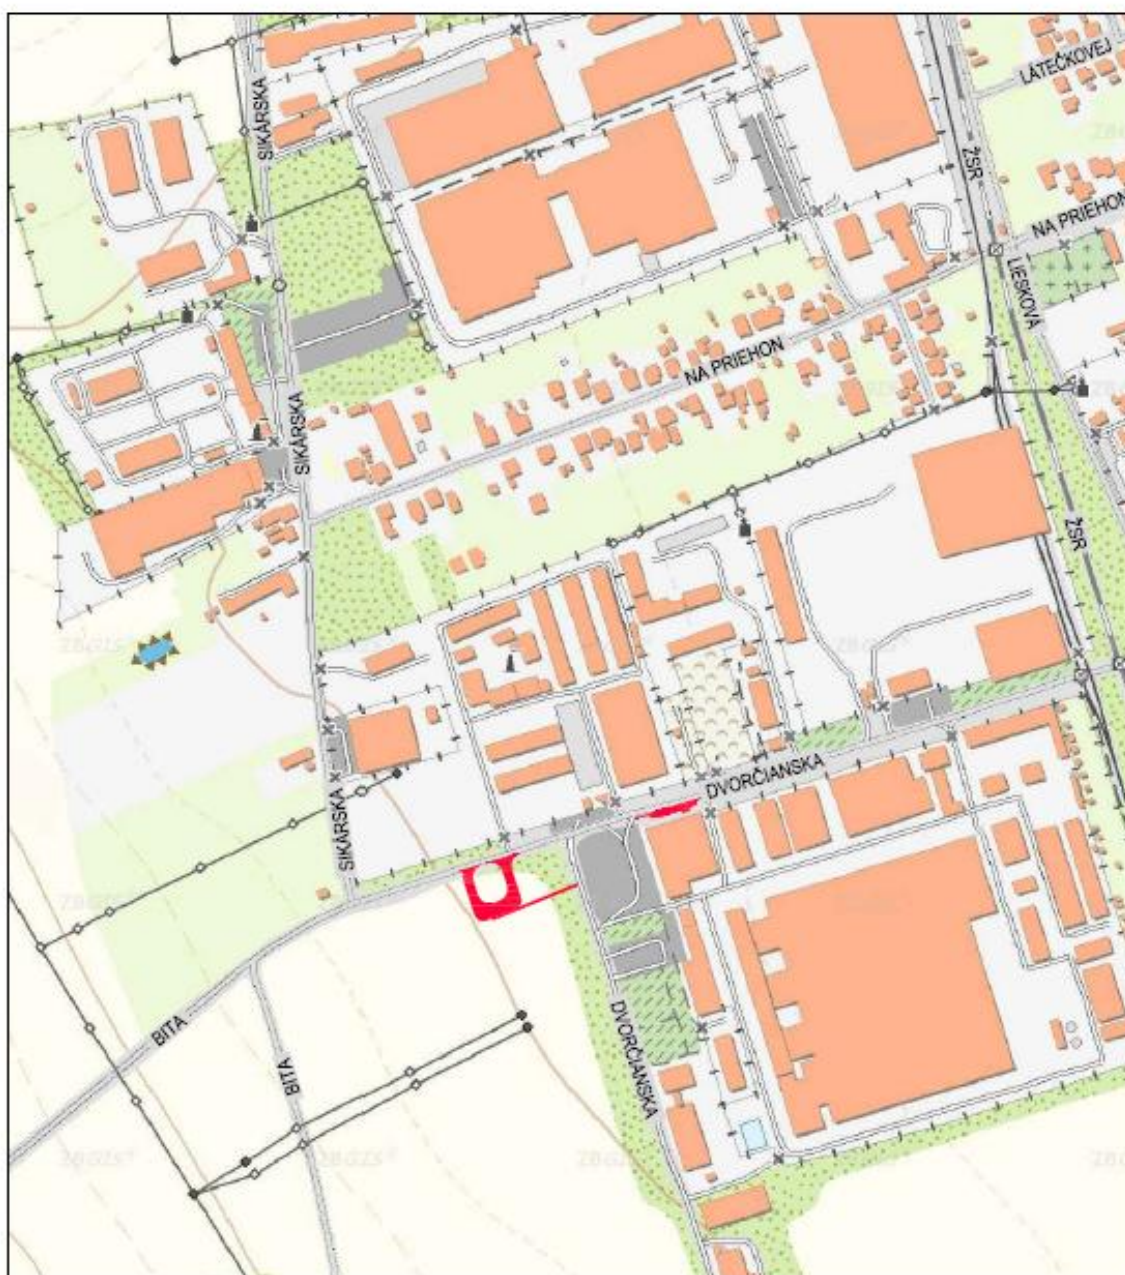


LEGENDA :

MIESTO STAVBY

ZODP. PROJEKTANT: ING, ŠTEFAN LISÝ	PROJEKTANT: ING, ANDREJ MOLNÁR	VYPRACOVAL: ING, ANDREJ MOLNÁR		
OBJEDNÁVATEL: MESTO NITRA			DRUH STUPŇA	DSP+RP
NÁZOV: Obratisko cestnej verejnej osobnej dopravy Dvorčianska ulica - Nitra			Č.ZÁKAZKY	02-2017
			DÁTUM	05/2017
			MIERKA	1 : 5000
			FORMÁT	1 x A4
OBSAH VÝKRESU: Prehľadná situácia umiestnenia stavby			PROFESIA: DOPRAVA	PRÍLOHA: C

Komunitné centrum Nitra - Dražovce NFP302020BQD7		
Podanie žiadosti o NFP	17.05.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	12/2022, číslo zmluvy 2778/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	459 069,43€	
Celková výška oprávnených výdavkov	483 230,98 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	24 161,55 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
410 746, 33 €	48 323, 10 €	24 161,55 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov v zmysle zmluvy o NFP	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	2/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	Ukončené, pred podpisom zmluvy	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác	PP Invest, s.r.o.	
Stavebný dozor	interný	
Cena diela v zmysle ZoD	455 880 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2023	
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	Konzultácia s OŠMaŠ, OSS – v areáli školy	
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

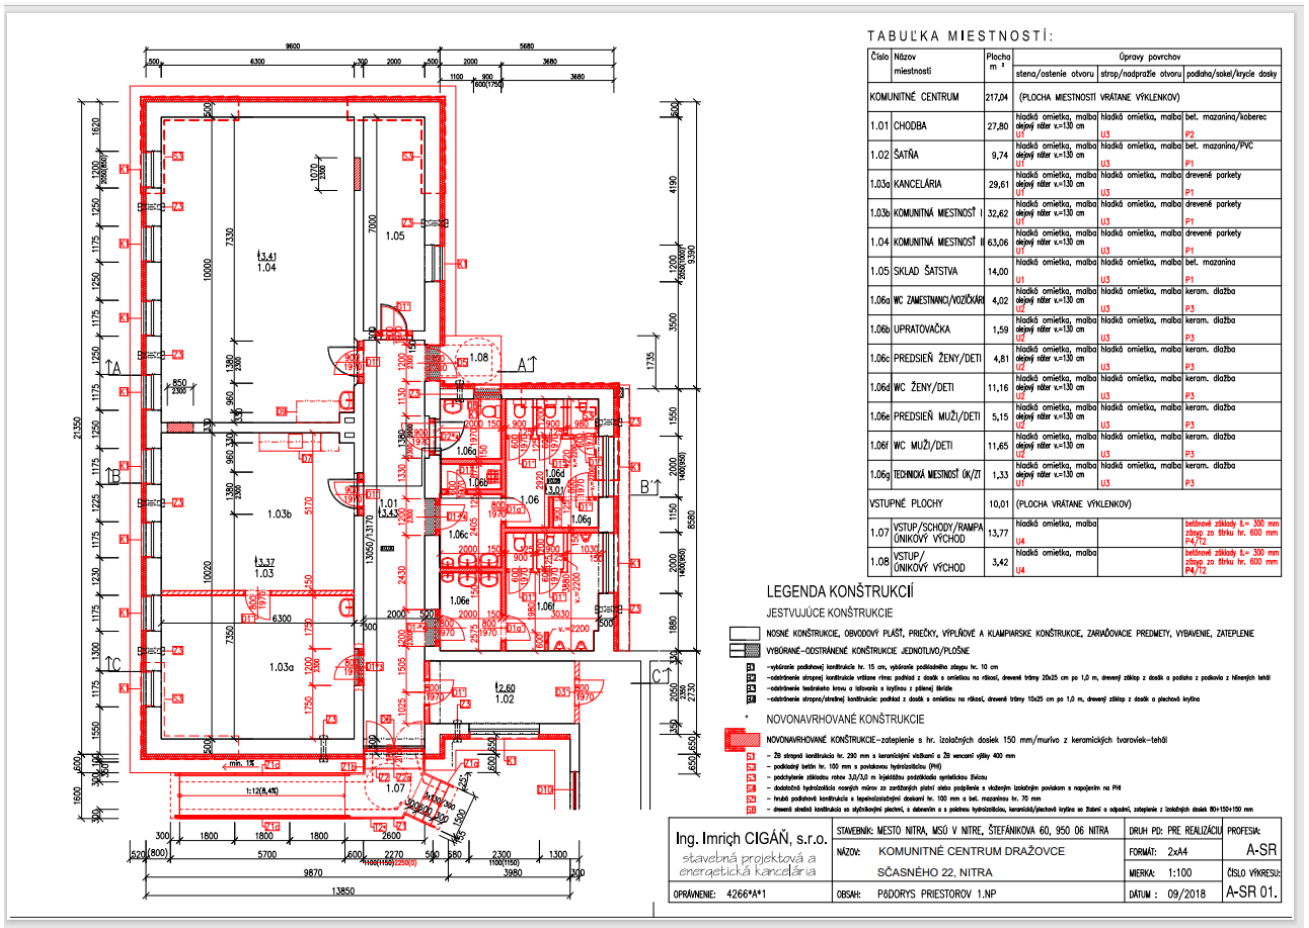

TABUĽKA MIESTNOSTÍ:

Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Plocha m ²	Úpravy povrchov		
			stena/ostenie otvoru	strop/nadprstie otvoru	podlaha/sokla/lyžce dosky
KOMUNITNÉ CENTRUM 217,24 (PLOCHA MIESTNOSTÍ VŤRÁTANE VÝKLENKOV)					
1.01	CHODBA	27,80	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	bet. mazačina/koberec: P2
1.02	ŠATŇA	9,74	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	bet. mazačina/PVC: P1
1.03a	KANCELÁRIA	29,61	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	drevené parkety: P1
1.03b	KOMUNITNÁ MIESTNOSŤ I	32,62	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	drevené parkety: P1
1.04	KOMUNITNÁ MIESTNOSŤ II	63,06	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	drevené parkety: P1
1.05	SKLAD ŠATSTVA	14,00	Hladká omietka, malba U3	Hladká omietka, malba U3	bet. mazačina: P1
1.06a	WC ZAMESTNANCOV/VOZÁČOV	4,02	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06b	UPRATOVAČKA	1,58	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06c	PREDSIEN ŽENY/DETI	4,81	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06d	WC ŽENY/DETI	11,16	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06e	PREDSIEN MUŽY/DETI	5,15	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06f	WC MUŽY/DETI	11,65	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
1.06g	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ (K/Ž)	1,33	Hladká omietka, malba dejný náter k=130 cm U3	Hladká omietka, malba U3	keram. dlažba: P3
VSTUPNÉ PLOCHY 10,01 (PLOCHA VŤRÁTANE VÝKLENKOV)					
1.07	VSTUP/SCHODY/RAMPA ÚNIKOVÝ VÝCHOD	13,77	Hladká omietka, malba U4		betónové základy š. 300 mm záleg. zo štrku hr. 600 mm P4/7/2
1.08	VSTUP/ÚNIKOVÝ VÝCHOD	3,42	Hladká omietka, malba U4		betónové základy š. 300 mm záleg. zo štrku hr. 600 mm P4/7/2


LEGENDA KONŠTRUKCIÍ

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE**
- HOSNÉ KONŠTRUKCIE, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, PRIECHY, VÝPLŇOVÉ A KLAMPARSKÉ KONŠTRUKCIE, ZÁVŇAZOVACE, PŘEMETY, VÝBERNÉ, ZATEPLENÉ
 - VYBERANÉ-OSTRANENÉ KONŠTRUKCIE, JEDNOTLIVÉ/PLOŠNÉ
 - vykvalifikované podlažné konštrukcie hr. 15 cm, vybrané podlažné základy hr. 10 cm
 - vykvalifikované stropné konštrukcie vrátane výškových podlaží a stropu v osteniach na stĺpoch, dĺžka výškov 20x25 cm po 1,0 m, dĺžka záleg. z dosky a podlaží z kĺbových želez
 - vykvalifikované nosiče stropu a ľahových a kryštalov z pláňovej želez
 - vykvalifikované stropné/obložkové konštrukcie podlaží z dosky a osteniaca na rábľach, dĺžka výškov 10x25 cm po 1,0 m, dĺžka záleg. z dosky a pláňových želez
- NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE**
- NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE-zateplenie a hr. izolácijských dosiek 150 mm/murivo z keramických teraciek-terčid
 - 28 stropné konštrukcie hr. 200 mm a keramických obložiek a 28 stropných výškov 400 mm
 - podlažné terče hr. 100 mm s prídavnou tepelnou izoláciou (PII)
 - podlažné základy stĺpov 300/300 mm s tepelnou izoláciou podlažných stĺpov
 - doskové železnobetonové nosiče stropu so zateplením pláňovej želez a výškových podlaží podlaží a stropných želez na PII
 - terčid podlažné konštrukcie a ľahových/obložkových dosiek hr. 100 mm a bet. mazačina hr. 70 mm
 - doskové stropné konštrukcie so železnobetonovými, s obložkami a z podlaží železnobetonovými, keramickými/teraciovými kryštalov so železom a výškovými, zateplenie z izolácijských dosiek 100/100/150 mm

Ing. Imrich CIGÁN, s.r.o. stavebná projektová a energetická kancelária	STAVEBNÍK: MESTO NITRA, MŠÚ V NITRE, ŠTEFÁNKOVA 60, 950 06 NITRA	DRUH PD: PRE REALIZÁCIU	PROFESIA:
OPRÁVENIE: 4266/M*1	NÁZOV: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAŽOVCE SČASNEHO 22, NITRA	FORMÁT: 2xA4	A-SR
	OBŠA: PADOŤSŤ PRIESTOROV 1.NP	MERKA: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU:
		DATEM: 09/2018	A-SR 01.

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA		
NFP302040K335		
Podanie žiadosti o NFP	01.08.2017	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	3/2018, číslo zmluvy - 768/2018	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	63 643,50 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	66 993. 16 €	
Celkový výška neoprávnených výdavkov	22 444,36 € (aktualizácia rozpočtu pred VO)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	3 349,66 €	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
56 944, 19 €	6 699, 32 €	3 349,66 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	81 mesiacov (vrátane podporných aktivít), realizácia diela 7-8 mesiacov, v súlade so zmluvou NFP (dĺžka naviazaná na vypracovanie PD)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	Opakované VO. Z dôvodu navýšenia cien v stavebníctve v dôsledku prebiehajúcej krízy a následne neschopnosti zrealizovať dielo zo strany zazmluvneného uchádzača Intersystem EU s.r.o. za dohodnutú cenu diela, sme museli pristúpiť k dohode o ukončení zmluvy o dielo v decembri 2022. Koncom roka 2022 prebehla aktualizácia PHZ a plánujeme vyhlásiť opätovne súťaž na uvedenú zákazku. Nie je vyhlásené.	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy		
Ukončenie procesu VO		
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác		
Stavebný dozor		
Cena diela v zmysle ZoD		
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	

Katastrálne územie: Mlynáre

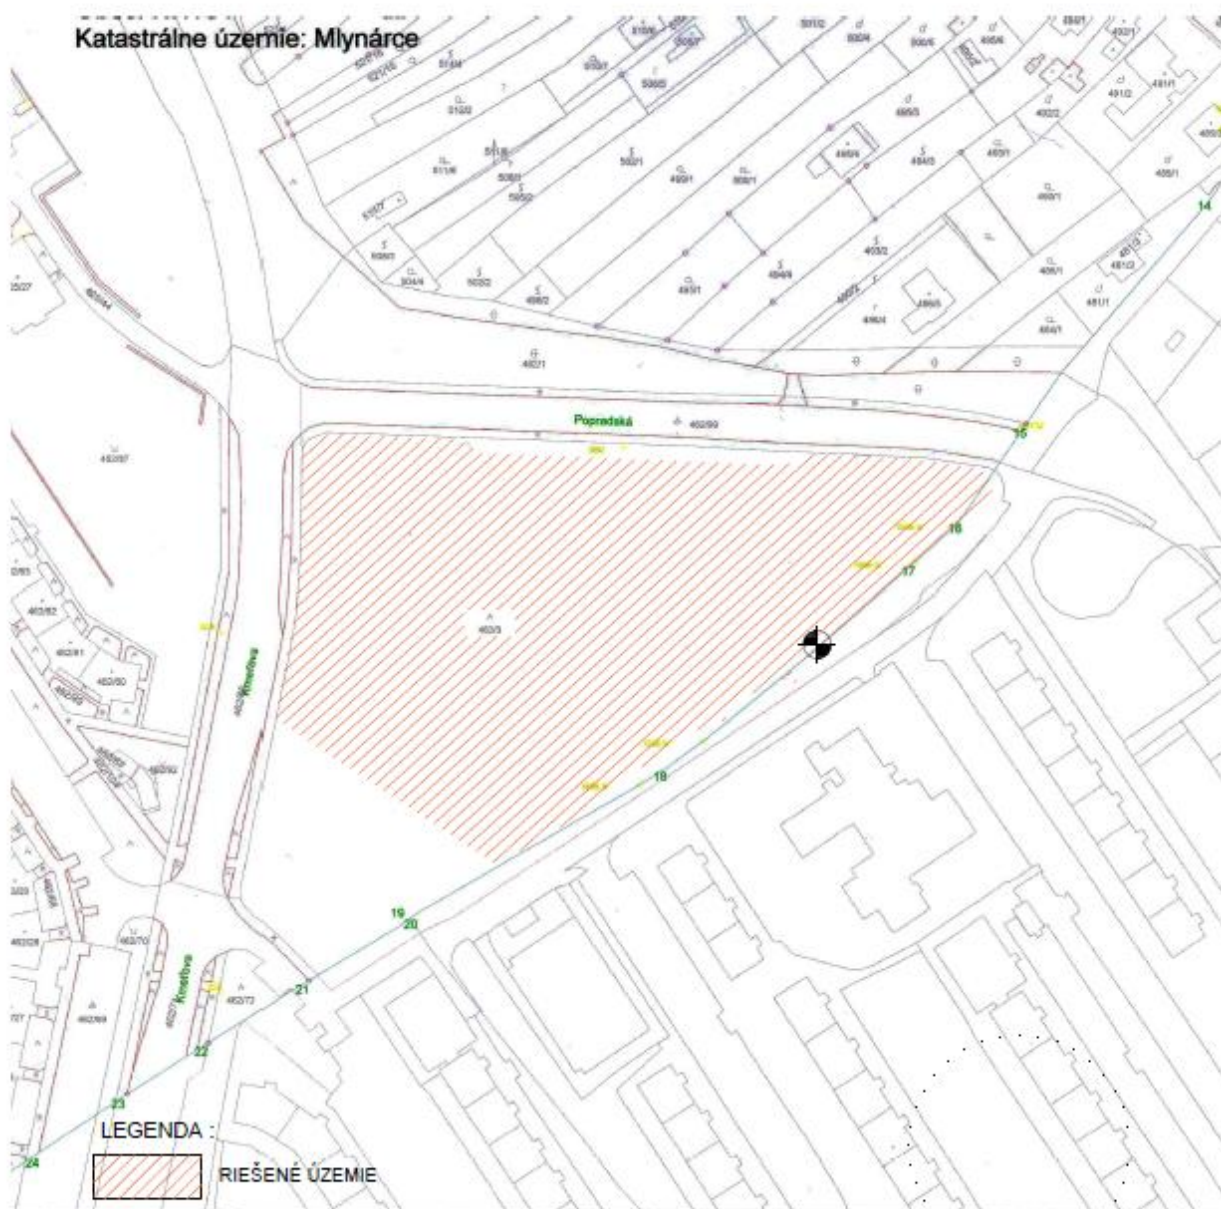

LEGENDA :
 RIEŠENÉ ÚZEMIE


VÝŠKA BALZ. P.V.  PVB=186,31 (BETONOVÝ STĽP.)		SMEANI ARCHITECTURE INTERIOR  S.A.I. spoločnosť s r.o. Jodkova 43 910 01 Nitra Slovakia TEL: (03734) 48172 ard@uradegroup.com www.arduradegroup.com		
VEDÁCILOHY - AUTOR Ing.arch. Ivan Šuráni	PROJEKTANT Ing.arch. Ivan Šuráni			PREJUL Ing.arch. Ivan Šuráni
OBJAVOVATEĽ - INVESTOR Mesto Nitra, Štefánikova tréida 60, 950 06 Nitra				
NÁZOV STAVBY: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ-KMEŤOVA, NITRA		ZHODNÁ ÚPRAVA PD		
MIEŠTO STAVBY: NITRA - POPRADSKÁ - KMEŤOVA POZEMOK P.Č. 462/3		STUPEŇ PD	PROJEKT OHL.POV.	
OB SAH: SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY		ORIENTÁCIA 	STAVEBNÝ OBJEKT	
		PROFESIA: ARCHITECTÚRA	ČÍSLO VÝKRESU: A-1	
		FORMÁT	1 A4	
		DÁTUM	04/2017	
		ZÁKAZ. ČÍSLO	1004/2017	
		MIERKA	1:2000	

BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry NFP302040K336		
Podanie žiadosti o NFP	13.03.2019	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	28.06.2019, číslo zmluvy 2007/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	284 938,72 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	299 935,50 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	10 682,9 € (rozdiel medzi NFP a ZoD)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	14 996,78 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
254 945, 18 €	29 993, 55 €	14 996,78 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	20 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	6/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Po ex post kontrole zmluvy na RO a doručení správy s kladným výsledkom sme pristúpili k odovzdaniu staveniska dodávateľovi, a to po nadobudnutí účinnosti zmluvy 2077/2021/OPaSR, dňa 01.03. 2022.	
Ukončenie procesu VO	7/2021	
Podpis zmluvy o dielo	11/2021 , číslo zmluvy 2077/2021	
Dodávateľ stavebných prác	Green Project	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	310 618, 40 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	01.03.2022	
Dátum skutočného začatia prác	01.03.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	3/2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	01.07.2022	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	98 214,48 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	5.08.2022	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	



1. Lavička s výhľadom na Zobor a kvitnúce šafrany v trávniku začiatkom jari, novovysadená skupina bríez v blízkosti športových prvkov na bežeckom okruhu
2. Stromoradie z kvitnúcich čerešní, kvitnúce narcisy a modrice v trávniku pred skupinou novovysadených bríez neďaleko detského ihriska s pružinovými hračkami a lavičkou
3. Solitérny dub s piknikovými stolmi, pestrofarebné kvitnúca lúka v lete a výsadba bríez v pozadí
4. Dažďová záhrada s kvitnúcimi trvalkami a okrasnými trávami a žltá starbenými brezami na jeseň

GEN. PROJEKTANT	RUDBECKIA, s.r.o.	 záhradná a krajinná tvorba Ing. J. Štráňšková Ing. Z. Duránová Mesto Nitra k. ú. Chrenová	STUPEŇ PD	RP
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Júlia Štráňšková		DÁTUM	05/2017
VYPRACOVAL	Ing. Júlia Štráňšková		FORMÁT	2 X A4
INVESTOR	Mesto Nitra			
MIESTO STAVBY	k. ú. Chrenová			
SADA	NÁZOV STAVBY	BREZOVÝ HÁJ v Nitre - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry		
STAVEBNÝ OBJEKT	A 01 NÁVRH A VIZUALIZÁCIE	ČÍSLO	A 01.6	
ORSAH	VIZUALIZÁCIE			


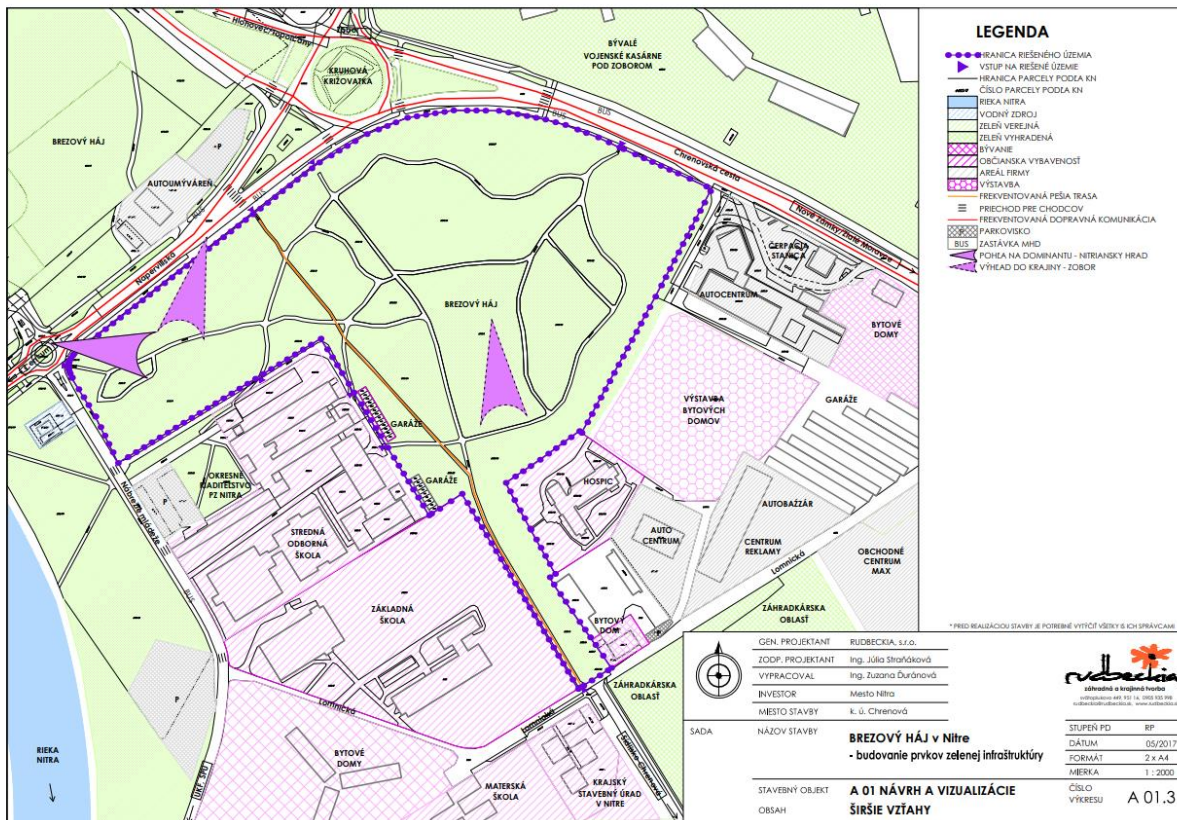


Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová		
Fond na podporu športu		
Podanie žiadosti o príspevku	31.01.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí príspevku	9/2022, číslo zmluvy 1712/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci príspevku	277 920,00 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	463 200,00 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	185 280,00 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	80 % dotácie zaslaný na účet mesta	
Podiel financovania		
EÚ	ŠR 60%	Prijímateľ 40%
0%	277 920 €	185 280 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	6 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	3/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	VO zaslané na kontrolu na Fond na podporu športu ex ante pred podpisom zmluvy o príspevku	
Ukončenie procesu VO	6/2022	
Podpis zmluvy o dielo	16.06.2022, číslo zmluvy 1357/2022	
Dodávateľ stavebných prác	PP Invest, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	463 200 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	01.04.2023	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 01.04.2023	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	V realizácii, termín ukončenia prác 10/2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	




Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park NFP302040J297		
Podanie žiadosti o NFP	13.03.2019	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	28.6. 2019, číslo zmluvy 1426/2019	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	629 415,40 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	662 542,53 €	
Celkový výška neoprávnených výdavkov	30 987,49 suma z rozpočtu zmluvy o NFP-stavebné práce	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	33 127, 13 €	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
563 161, 15 €	66 254, 25 €	33 127, 13 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	80 mesiacov (vrátane podporných aktivít) z toho 19 mesiacov realizácia diela v súlade so zmluvou o NFP, dĺžka naviazaná na vypracovanie PD	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	6/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Správa z EX-Post kontroly bola doručená 15.03.2022 s kladným hodnotením	
Ukončenie procesu VO	10/2022	
Podpis zmluvy o dielo	07.10.2021, číslo zmluvy 1857/2021	
Dodávateľ stavebných prác	Ing. Jozef Horniak - Vialle	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	693 530,02 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	3/ 2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa po doručení kladnej správy z ex post kontroly 3/2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa po doručení kladnej správy z ex post kontroly 3/2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	09.09.2022	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	192 880,49 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	08.12.2022	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	214 679,37 € z toho neoprávnené 16 848 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia tretej ŽoP	17.2.2023	

Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	166 463,47 € z toho neoprávnené 7 332 €
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-

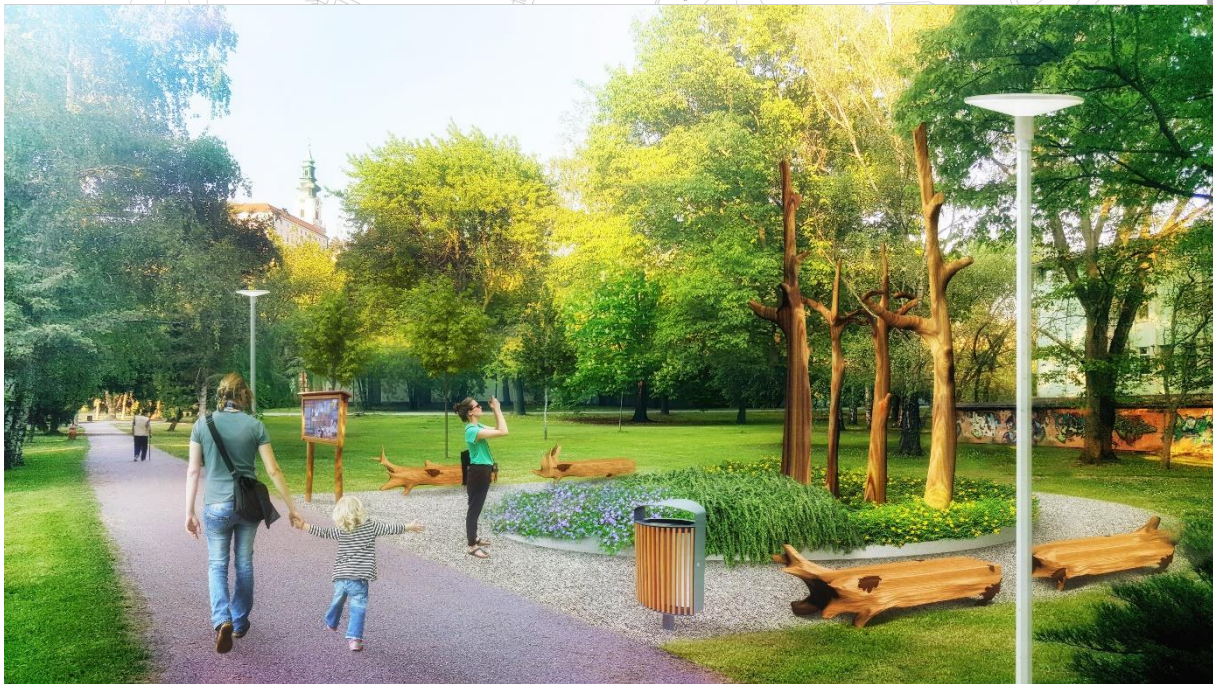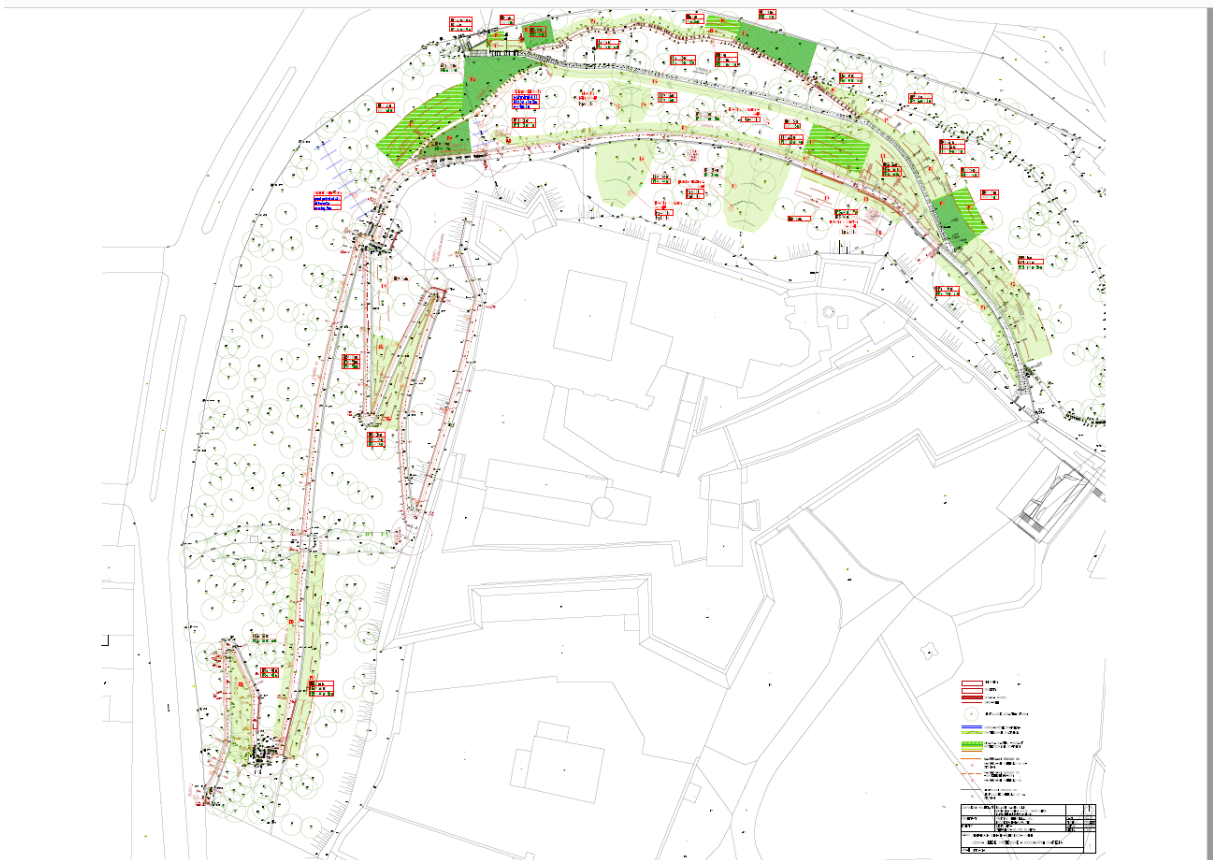

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra NFP302010BDH6		
Podanie žiadosti o NFP	28.07.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 875/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	158 720,84 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	167 074,57 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	11 034,37 € (neoprávnené aktivity v rámci výzvy)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	8 353,73 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
142 013, 38 €	16 707, 46 €	8 353,73 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	1/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	4/2022 vo vyhodnocovaní (predpoklad)	
Podpis zmluvy o dielo	-	
Dodávateľ stavebných prác	-	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	-	
Dátum začatia prác podľa ZoD	-	
Dátum skutočného začatia prác	-	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-	
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

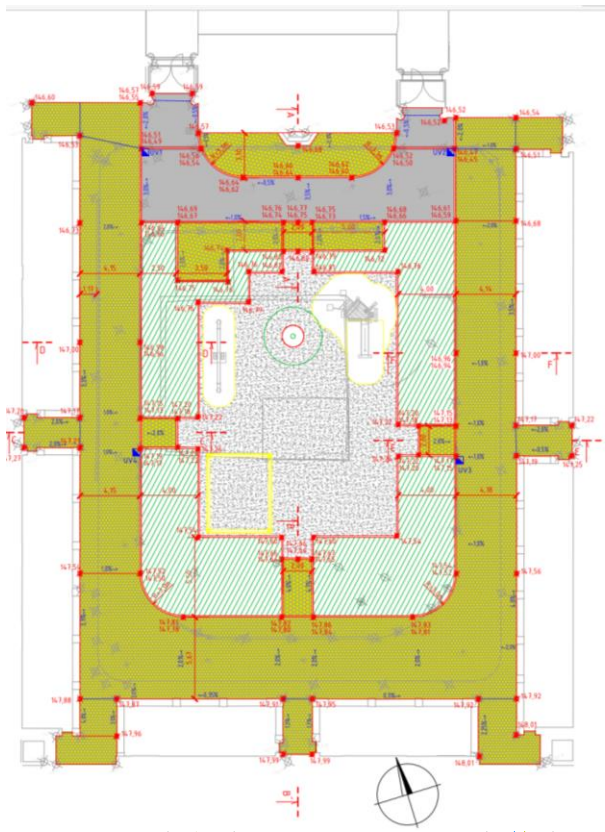


LEGENDA:

- ULOŽNÝ VPUSŤ
- GEODETICKÉ ZAMERANIE EX. STAVU
- SO 02.02 OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA**
- 1.KOMUNIKÁCIA – BETONOVÁ DLAŽBA, POJAZDNÁ HR. 0,08m (SEDA)
- SO 02.01 SPEVNENÉ PLOCHY**
- 2.CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA, HR. 0,06m (SEDA)
- NESPEVNENÁ PLOCHA – MLAT
- ZELENÝ PÁS

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpM

ZÁPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Richard Urban	 R-PROJECT INVEST, s. r. o. Právnym 27, 821 08 Bratislava IČO: 453 2 533 00 000 www.r-project-invest.sk						
VYKONÁVATEĽ	Ing. Martin Kečkeš							
KONTROLOVÁTEĽ	Ing. Richard Urban							
AUTOR PROJEKTU	PK Digital, s. r. o.	 PK Digital, s. r. o. Sokolova 146/2 00100 Bratislava						
HLAVNÝ AŽIJER PROJEKTU	Ing. Martin Pákalik, PhD.							
OBJEDNÁVATEĽ	Mesto Nitra, Štefánikova trneda 60, 950 06 Nitra	ADRESA	Strojov 17-21, 940 01 Nitra	PARCELA	2128/3 a 6, 940/4	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
STAVBA	Projektová dokumentácia pre realizáciu zámernu revitalizácie dvorovej časti mestskej časti na Šturovej ul. 17-21, parc. číslo 2128/3, K.Ú. Nitra		PROFESIA	ARCHITECTURA		FORMÁT	A3	A
OBJEKT	SO 02.02 Obslužná komunikácia		DÁTUM	01/2020		MERKA	1:200	
VÝKRES	Situácia		ČÍSLO ZÁK.			Č. VÝKRR.		02

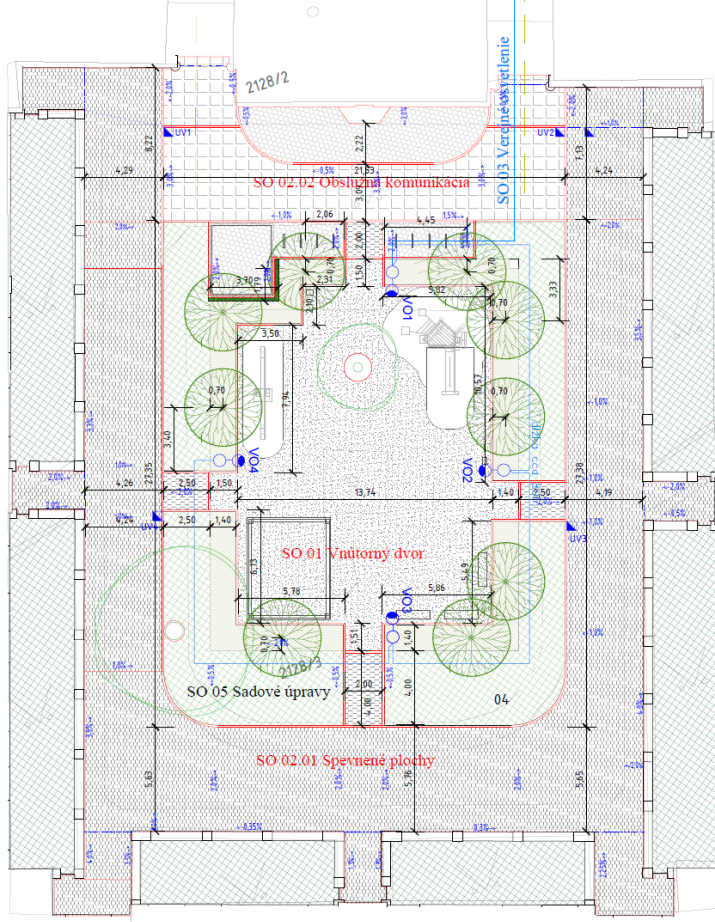

- LEGENDA:
- Smerový káň
 - Stojan na bicykle
 - Lampa
 - Hrajba
 - Hracia zostava
 - Komunikácia bet. dlažba pojazdná
 - Chodník - bet. dlažba
 - Nepevná plocha - MLAT
 - Osvetlenie
 - Existujúce vonkajšie osvetlenie uličná svietidla
 - Zelený predzáhon
 - Strom novonavyšovaný
 - Strom pôvodný
 - Navrhovaná výsadba krov
 - Navrhovaný trávnikový záhon

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01	Vnútorný dvor	9
SO 02.01	Spevnené plochy	2
SO 02.02	Obslužná komunikácia	1
SO 02	Vonkajšie osvetlenie	2
SO 04	Sadové úpravy	

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpM

ZÁPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Richard Urban	 R-PROJECT INVEST, s. r. o. Právnym 27, 821 08 Bratislava IČO: 453 2 533 00 000 www.r-project-invest.sk						
VYKONÁVATEĽ	Ing. Martin Kečkeš							
KONTROLOVÁTEĽ	Ing. Richard Urban							
AUTOR PROJEKTU	PK Digital, s. r. o.	 PK Digital, s. r. o. Sokolova 146/2 00100 Bratislava						
HLAVNÝ AŽIJER PROJEKTU	Ing. Martin Pákalik, PhD.							
OBJEDNÁVATEĽ	Mesto Nitra, Štefánikova trneda 60, 950 06 Nitra	ADRESA	Strojov 17-21, 940 01 Nitra	PARCELA	2128/3 a 6, 940/4	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
STAVBA	Projektová dokumentácia pre realizáciu zámernu revitalizácie dvorovej časti mestskej časti na Šturovej ul. 17-21, parc. číslo 2128/3, K.Ú. Nitra		PROFESIA	ARCHITECTURA		FORMÁT	A3	B1
OBJEKT	SO 02.02 Obslužná komunikácia		DÁTUM	01/2020		MERKA	1:200	
VÝKRES	Koordinátna situácia		ČÍSLO ZÁK.			Č. VÝKRR.		02

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre NFP302040BDG8		
Podanie žiadosti o NFP	31.01.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP		
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	762 564,80 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	802 699,79 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	107 935,92 € (po indexácii zmluvy)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	40 134,99 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
682 294, 82 €	80 269, 98 €	40 134,99 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	7 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	12/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, z dôvodu konca programového obdobia.	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo	11.05.2022, číslo zmluvy 1157/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Megapol, spol. s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	719 973,31 € + dodatok č. 1 (indexácia 107 935,92 €)	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2023	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 12.4.2023	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 12.04.2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	



Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra NFP302040BDD3		
Podanie žiadosti o NFP	24.06.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 857/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	37 372,01€	
Celková výška oprávnených výdavkov	39 338,96 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	3 905,60 € (žiadosť o indexáciu projektu)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	1 966, 95 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
33 438, 12 €	3 933, 90 €	1 966, 95 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	7 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	10/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ	
Ukončenie procesu VO	3/2022	
Podpis zmluvy o dielo	21.03.2022, číslo zmluvy 578/2022	
Dodávateľ stavebných prác	RUDBECKIA, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	39 056, 38 € , požiadavka na indexáciu cien	
Dátum začatia prác podľa ZoD	Nie sú financie na indexáciu cien – nezačalo sa.	
Dátum skutočného začatia prác	-	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	
Dátum predloženia tretej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	



- LEGENDA:**
- OBECNÁ PÉREŠKOVÁ LÍNIA
 - OBECNÉ DŮLHOŠKÉ DĚLÍ
 - KOSMÉDIE A OPLOMĚNÉ PLOCHY (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - VEŠTĚNÉ PLOCHY ŽELEZNIČNÍ ÚSEKOVÉ ÚSTUPNÍ
 - TRAVNATÉ PLOCHY (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - ZAPLOMĚNÉ STROMY A VOŠKY VE ŠPONTÁNNĚ VYKROUŠENÉ PLOCHĚ
 - PŮVODNÍ ŽELEZNÝKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - PŮVODNÍ VOŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - PŮVODNÍ VOŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
- NAVŠHOVANÉ PRVKY:**
- NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)
 - NAVŠHOVANÉ VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)

ZADÁVATEL: OBEC STARÝ PÁRKOVA	LAN_AR__																		
PROJEKTANT: BUREAU ARCHITECTURA																			
INVESTOR: OBEC STARÝ PÁRKOVA	3																		
STAVBA: OBNOVA VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)																			
PROJEKT: VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)																			
STAVBA: VEŠKOVITÝ STROM (SÍŤ DO KOSMÉDIE)																			
OBEC STARÝ PÁRKOVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DATEL:</td> <td>2021</td> <td>STRANA:</td> </tr> <tr> <td>STRANA:</td> <td>01</td> <td>CELKOVÝ:</td> </tr> <tr> <td>CELKOVÝ:</td> <td>01</td> <td>STRANA:</td> </tr> <tr> <td>STRANA:</td> <td>01</td> <td>CELKOVÝ:</td> </tr> <tr> <td>CELKOVÝ:</td> <td>01</td> <td>STRANA:</td> </tr> <tr> <td>STRANA:</td> <td>01</td> <td>CELKOVÝ:</td> </tr> </table>	DATEL:	2021	STRANA:	STRANA:	01	CELKOVÝ:	CELKOVÝ:	01	STRANA:	STRANA:	01	CELKOVÝ:	CELKOVÝ:	01	STRANA:	STRANA:	01	CELKOVÝ:
DATEL:	2021	STRANA:																	
STRANA:	01	CELKOVÝ:																	
CELKOVÝ:	01	STRANA:																	
STRANA:	01	CELKOVÝ:																	
CELKOVÝ:	01	STRANA:																	
STRANA:	01	CELKOVÝ:																	


Obnova Starého parku v Nitre
NFP302010BCA7

Podanie žiadosti o NFP

27.07.2021

Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 858/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	5 755 005,34 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	6 057 900,36 €	
Z toho stavebné práce	4 070 592, 62 €	
Z toho detské prvky	1 585 710,50 € (PHZ) – 1 902 852,6 € s DPH	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	302 895, 02€	
Predpokladané práce navyše	100 000 € (vodovodné prípojky, zakladanie móla, most do obory, zábradlie, búracie práce)	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
5 149 215, 31 €	605 790, 03 €	302 895, 02€
Obnova Starého parku – aktivita stavba		
Dĺžka hlavných aktivít projektu	13 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	5/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	3/2023 zaslaná zmluva na ex post kontrolu, účinnosť zmluvy je naviazaná na zverejnenie v CRZ, výsledok ex post kontroly 19.4.2023	
Ukončenie procesu VO	10/2022	
Podpis zmluvy o dielo	27.10.2022, číslo zmluvy 2380/2022	
Dodávateľ stavebných prác	DYNAMIK HOLDING, a.s.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	4 070 592, 62 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	11/2022	
Dátum skutočného začatia prác	15.11.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	15.11.2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	28.02.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	79 401,06 €– pozastavené spracovanie	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	03.03.2023	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	15 880, 21 € – pozastavené spracovanie	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom		
Dátum predloženia tretej ŽoP	24.03.2023	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	101 643,10 € - pozastavené spracovanie	

Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-
Obnova Starého parku v Nitre – detské prvky a mobiliár	
Dĺžka hlavných aktivít projektu	6 mesiacov
Dĺžka podporných aktivít projektu	
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/2023
Vyhlásenie VO (výzva)	2/2023
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	-
Ukončenie procesu VO	Predpoklad 4/2023
Podpis zmluvy o dielo	-
Dodávateľ stavebných prác	-
Stavebný dozor	Interný
Cena diela v zmysle ZoD	PHZ – 1 585 710, 5 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	
Dátum skutočného začatia prác	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	
Predpokladaný termín ukončenia prác	
Dátum predloženia prvej ŽoP	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	
Dátum predloženia druhej ŽoP	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	
Dátum predloženia tretej ŽoP	
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	

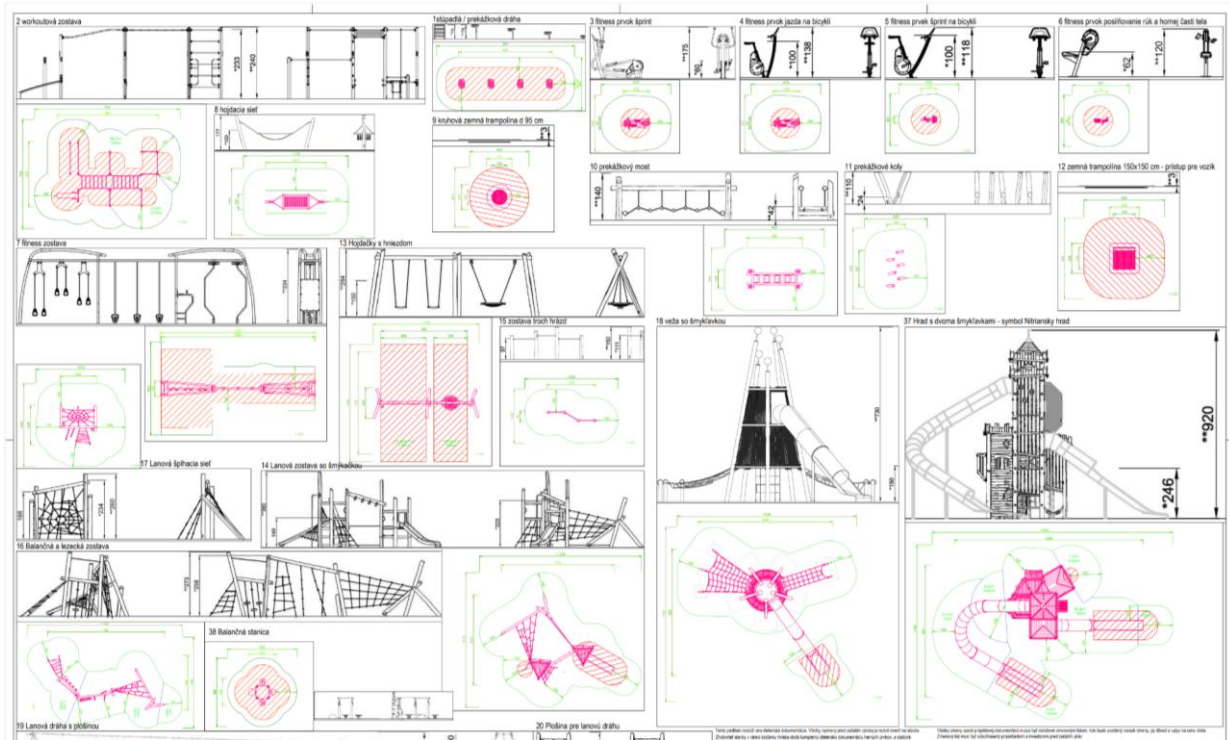

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku NFP302010A VZ5		
Podanie žiadosti o NFP	10.03.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	8/2021, číslo zmluvy 1386/2021	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	591 816, 79 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	622 965,04 €	
Celkový výška neoprávnených výdavkov	199 806,56 € (výška COV definovaná RO MIRRI)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	31 148, 26 €	
Predpokladané práce navyše	5 284,53 € (oporné múry)	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ	ŠR	Prijímateľ
85%	10%	5%
Dĺžka hlavných aktivít projektu	7 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	3/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Dátum vyhotovenia správy z kontroly bol 22.11.2022. Zmluva o dielo bola podpísaná 23.5.2022	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo	23.05.2022, číslo zmluvy 1167/2022	
Dodávateľ stavebných prác	EUROVIA SK, a.s.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	822 771, 54 € (výška ceny diela - prudký nárast cien v čase podania ŽoNFP a spustením VO) - dlhé hodnotenie na RO	
Dátum začatia prác podľa ZoD	3/2023	
Dátum skutočného začatia prác	16.03.2023	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	16.03.2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum predloženia druhej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	--	



SITUÁCIA M 1:500



POZNÁMKA:
 INŽENIERSKÉ SIETE SÚ VYRIEŠENÉ PRE STAV PO DOKONČENÍ
 STAVBY "REKONŠTRUKCIA UNIVERZITNÉHO MOSTA A
 "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV NITRA-CHRENOVÁ 2. ST".
 ZNAČENÉ STAVBY POSKYDZUJE JE PODMIEŇENÉ DOKONČENÍM
 VŠECH VYŠŠÍCH STAVIEB

LEGENDA PLOCH:
 CYKLOTRASA, ZÁMKNÁ DLAŽBA HR.80mm
 SPRIEVENIE KAMERŔOV DO BETÓNU
 ODMOSKOVANIE + SPRIEVENIE OČISŤOVAČOU +
 OSETE TRAVNÝM SEMENOM
 HRANICA TRVALÉHO ZABERU
 HRANICA DOČASNÉHO ZABERU

LEGENDA SIETI:
 OZNAKOVACIE VEDEŇE
 ELEKTRIČNÉ VEDEŇE
 VEKOVÉ OSVETLENÉ
 KANALIZÁČIA
 VODOVOD
 STL. PLYNOVOD

ARDA Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TRA.Hlinka	
STAVBA PO DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE / REALIZÁCIU STAVBY	
OBJEDNÁVATEL MESTO NITRA Štefánikova trída 60, 950 06 Nitra	
PROJEKTOVÝ PO Stráský, Husty a partneri s.r.o. Bohunická 50, 619 00 Brno	
CEL. ZÁKAZNÍK 1638	

SO 101-00		D	
NÁZOV OBJEKTU SO 101 - Cyklotrasa pri rieke Nitra		VÝKONOVÝ SYSTÉM 	
NÁZOV PRÍLOHY SITUÁCIA		ČÍSLO 02	STRANA 02



Kreatívne centrum Nitra NFP302030ADT3		
Podanie žiadosti o NFP	11.11.2020	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	12/2020, číslo zmluvy 2268/2020	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	15 568 577,66 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	16 387 976,48 €	
Stavba - Martinský vrch	5 624 321,06 €	
Stavba – Kino Palace	2 687 588,99 €	
Samostatné hnutelné veci	2 630 658,19 €	
Poskytovanie špecifických služieb	1 379 348,64 €	
Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe	257 270,60 €	
Podpora zamestnanosti a tvorby pracovných miest	363 904,89 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	85 920,45 € Neoprávnené výdavky zo ŽoP. Suma vyčíslená v dodatku č.1 je v rokovaní zoprávniť. Dodatok č.2 ešte nie je a ani indexácia.	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	819 398,82 €	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
13 929 780 €	1 638 797,65 €	819 398,82 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	50 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Stavba Martinský vrch		
Vyhlásenie VO (výzva)	04.12.2020	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	31.03.2022, 05.04.2022	
Ukončenie procesu VO	2/2022	
Podpis zmluvy o dielo	23.02.2022; číslo zmluvy 363/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Adifex, a.s.	
Stavebný dozor	Externý HICO s.r.o. (neoprávnený výdavok - 41 724 €) Externý stavebný dozor nebol súčasťou ŽoNFP	
Cena diela v zmysle ZoD	5 624 321, 06 € (Adifex, a.s.)	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 06.04.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 01.04.2022	

Stavba Kino Palace	
Vyhlasenie VO (výzva)	22.06.2021
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	30.06.2022; 01.07.2022, 10.08.2022, 22.08.2022
Ukončenie procesu VO	6/2022
Podpis zmluvy o dielo	16.06.2022, číslo zmluvy 1332/2022
Dodávateľ stavebných prác	ELLIO, spol. s r.o.
Stavebný dozor	Externý – HICO s.r.o. (neoprávnený výdavok - 21 276 €) Externý stavebný dozor nebol súčasťou ŽoNFP
Cena diela v zmysle ZoD	2 687 588, 99 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	07.09.2022
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 13.09.2022
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 07.09.2022

Žiadosti o platbu na ďalšej strane – sumár za projekt.



Výdavok	Kód	Typ	Dátum odoslania na RO / SO	Suma nárokovaná – spolu	Suma oprávnená - spolu	Suma uhradená	Dátum úhrady	Suma - podiel EÚ (85 %)	Suma - podiel ŠR SR (10 %)	Suma - podiel VZ (5 %)
Martinský vrch	302031ADT3500501	Priebežná platba	9.11.2022	71497,21 €	71497,21 €	67922,35 €	27.3.2023	60772,63 €	7149,72 €	3574,86 €
Martinský vrch	302031ADT3500401	Priebežná platba	17.8.2022	235118,59 €	235118,59 €	223362,66 €	7.12.2022	199850,80 €	23511,86 €	11755,93 €
Martinský vrch	302031ADT3300701	Predfinancovanie	6.3.2023	171055,80 €		0,00 €	zatiaľ neuhradené	145397,43 €	17105,58 €	8552,79 €
Martinský vrch	302031ADT3300401	Predfinancovanie	20.12.2022	253438,44 €	251659,14 €	239076,18 €	30.3.2023	215422,67 €	25343,85 €	12671,92 €
Martinský vrch	302031ADT3300301	Predfinancovanie	21.11.2022	152753,50 €	152753,50 €	145115,82 €	16.3.2023	129840,48 €	15275,34 €	7637,68 €
Martinský vrch	302031ADT3300101	Predfinancovanie	2.9.2022	26947,25 €	26947,25 €	25599,89 €	8.12.2022	22905,16 €	2694,73 €	1347,36 €
Martinský vrch (prebieha podanie na MK SR)				329 472,72 €						
Kino Palace	302031ADT3300801	Predfinancovanie	24.3.2023	53486,56 €		0,00 €	zatiaľ neuhradené	45463,58 €	5348,65 €	2674,33 €
Kino Palace	302031ADT3300601	Predfinancovanie	15.2.2023	158817,54 €		0,00 €	zatiaľ neuhradené	134994,91 €	15881,75 €	7940,88 €
Kino Palace	302031ADT3300201	Predfinancovanie	18.11.2022	32262,96 €	32262,96 €	30649,81 €	14.3.2023	27423,52 €	3226,29 €	1613,15 €
PD Kino Palace	302031ADT3500101	Priebežná platba	13.8.2021	180733,56 €	94930,76 €	90184,22 €	23.11.2021	153623,53 €	18073,35 €	9036,68 €
bežné výdavky	302031ADT3500301	Priebežná platba	4.5.2022	24380,28 €	23987,96 €	22788,56 €	28.10.2022	20723,24 €	2438,03 €	1219,01 €
bežné výdavky	302031ADT3500201	Priebežná platba	21.2.2022	32229,59 €	29761,41 €	28273,34 €	6.6.2022	27395,15 €	3222,96 €	1611,48 €
